

Erhebungsbogen AC-Dienstleistungen

Servicepakete

Ich interessiere mich für folgende Dienstleistung:*

- ☐ **Paket 1:** Inbetriebnahme
- ☐ **Paket 2:** Inbetriebnahme & AC-Installation
- ☐ **Paket 3:** Individuelle Dienstleistung

Weitere
Informationen zu den
Paketen finden Sie
in der angehängten
Übersicht.

Das ausgewählte Paket soll auch die Inbetriebnahme dieser elektrischen Komponenten umfassen:*

☐ **Speicher** ☐ ohne Ersatzstromfähigkeit ☐ mit Ersatzstromfähigkeit

Speichergroße in kWh:

Hersteller:

Typ:

☐ **Home-Energy-Management-System (HEMS)**

Hersteller:

Typ:

☐ **Wallbox**

Hersteller:

Typ:

☐ **Heizstab**

Hersteller:

Typ:

Allgemeine Daten*

Projektanschrift

Name

Telefon

Straße / Hausnummer

E-Mail

PLZ

Ort

Ortsteil / Gemarkung

Flurstücksnummer

Ich bin ein

☐ **Privatkunde:** Anschrift:

☐ **Geschäftskunde:** Anschrift:

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Informationen zur PV-Anlage

Es handelt sich um eine:*

☐ Erstanlage / Neuanlage ☐ Erweiterung einer BestandsanlageModulbezeichnung: Nennleistung/Modul: Anzahl der Module: Installationsdatum:

(EEG 01.03.2025 in §3 Absatz 5 Inbetriebnahme)

PV-System*

☐ Mikrowechselrichter (Wevolt)☐ STRING (Wevolt)☐ AUTARQ (Wevolt)☐ PV-X-Tile (Wevolt)☐ Fremdanlage

Bezeichnung Wechselrichter

Anzahl Wechselrichter

Potential/Erdung*

Potentialausgleichsschiene vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein

Internet*

☐ Internet vorhanden (LAN oder WLAN) → stabil bis zum Zählerschrank☐ Wanddurchbruch zur Internetnutzung am Zählerschrank erforderlich

Informationen zum Zähler*

Zählernummer: Installationsdatum der elektrischen Anlage (Jahr): Typ: Messkonzept: ☐ Überschusseinspeisung ☐ Volleinspeisung ☐ Kaskadenschaltung ☐ Mieterstromkonzept☐ Sonstiges: ☐ Übergabezähler vorhanden☐ Zähler sollen umgebaut werden☐ Zähler sollen zusammengelegt werden☐ Zähler sollen abgemeldet werden

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Erforderliche Unterlagen

Dokumente*

- ☐ **Lageplan** (inkl. Grundstücksgrenzen und eingezeichnetem Aufstellungsort der Anlage)
- ☐ **Plan der PV-Anlage** (Anordnung und Anzahl der PV-Module)
- ☐ **Optional: Wevolt Montageplan der Mikrowechselrichter**
- ☐ **Stromlaufplan der PV-Anlage**

Bilder*

- ☐ **PV-Anlage** (auf dem Dach)
- ☐ **Kabelwege**
- ☐ **Potentialausgleichsschiene / Haupterdungsschiene des Gebäudes**
- ☐ **Wand / Bereich** (an der die Komponenten montiert werden sollen)
- ☐ **Zählerkasten innen und außen** (inkl. Überspannungsschutz)
- ☐ **Hausanschlusskasten**
- ☐ **Zähler** (Zählernummern müssen lesbar sein)
- ☐ **Optional: Standort von Speicher, HEMS, Wallbox oder Heizstab**

Hinweise

Die Beauftragung erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Daten.

Voraussetzungen: Der Zählerschrank muss den aktuell geltenden Bestimmungen des Netzbetreibers entsprechen und ausreichend Platz für den Einbau der benötigten Komponenten bieten. Der Abstand zwischen Zählerschrank und PV-Anlage / Speicher beträgt maximal 10 m. Ein verwendbarer Kabelweg inkl. Erdungskabel vom Dach bis zum Zählerschrank / PV-Anlage / Speicher ist verfügbar. Eine Potentialausgleichsschiene ist am Montageort vorhanden. Gegebenenfalls notwendige Mehrarbeiten, Anpassungen und Ergänzungen, die nicht abschätzbar waren, sind nicht im Preis enthalten.

Datenschutz*

Ich willige ein, dass die Wevolt Deutschland GmbH die erhobenen Daten zum Zwecke der Angebots- und Auftragsverarbeitung verwenden darf. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden Sie unter www.wienerberger.de/Datenschutzerklaerung. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und der Nutzung der erhobenen Daten widersprechen. Ihren Widerruf senden Sie bitte an die Wevolt Deutschland GmbH (Greisbacher Straße 6, 89331 Burgau) oder an Datenschutz.DE@wienerberger.com. Im Falle eines Widerrufs oder der Zweckerreichung werden ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht.

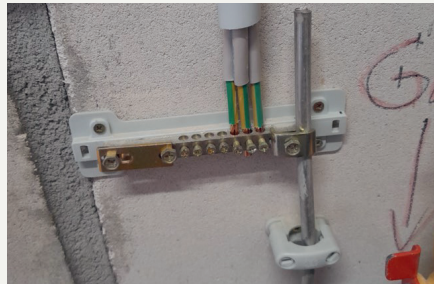
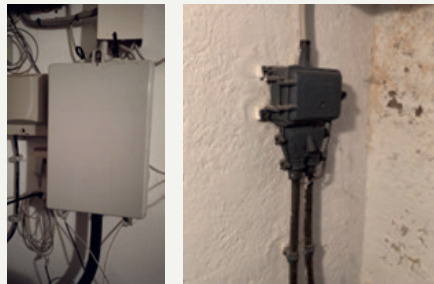
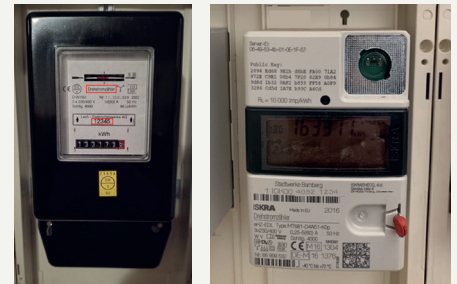
Ort, Datum

Unterschrift

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Anlage: Beispiele der benötigten Bilder der einzelnen Komponenten**1. PV-Anlage auf dem Dach**

(Die Anlage soll komplett zu sehen sein)

**2. Potentialausgleichsschiene****3. Wand/Bereich, an der die****Komponenten montiert werden sollen****4. Zählerschrank (Der Zählerschrank soll komplett zu sehen sein)****5. Hausanschlusskasten****6. Zähler (Zählernummer & -art müssen lesbar sein!)****7. Hauptleitungsschutzschalter mit Überspannungsschutz**
